

社会資本総合整備計画 事後評価書


令和5年 4月17日

計画の名称	1 安全・安心に利用できる都市公園の整備				交付対象	宮城県白石市									
計画の期間	平成24年度 (1年間)														
計画の目標	<p>【安全安心に利用できる公園整備】 市民や市内を訪れる多くの観光客が利用する公園にバリアフリー施設の改築を行い、施設機能の向上を目指し、誰もが安全で安心して利用できる公園整備を図る。</p>														
計画の成果目標 (定量的指標)	<p>【安全安心に利用できる公園整備】 バリアフリー施設 (トイレ) の設置と既存施設 (トイレ) のバリアフリー化されていない施設を緊急的に改築を行う。</p>														
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考					
							当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)						
① 公園内トイレのバリアフリー化							2か所	4か所	4か所						
②															
③															
全体事業費	合計 (A+B+C)	30百万円	A	30百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%					
事後評価															
○ 事後評価の実施体制、実施時期															
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期									
都市創造課において目標値の達成状況を確認						令和5年4月									
						公表の方法									
						白石市ホームページにて公開									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A1-1	公園	一般	白石市	直接	白石市	益岡公園安全・安心対策緊急総合支援事業	バリアフリースイートの改築	白石市						30	H24
小計										30					
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計										0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果									備考					
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計										0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果									備考					

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		既存施設（トイレ）のバリアフリー化されてない施設を緊急的に改築することで、利用者が安全安心に公園施設を利用できるようになった。			
II 定量的指標の達成状況	指標の公園トイレのバリアフリー化数	最終目標値	4	目標値と実績値に差が出た要因	需要度の判定が難しい点と、費用対効果の問題から最終実績値に止まったもの
		最終実績値	3		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
公園利用者からの需要を常に配慮しながら、国等の指針に従って適切に整備を行うとともに、既存のトイレ改修時にはバリアフリー化を積極的に進める					

計画の名称	1	安全・安心に利用できる都市公園の整備	交付対象	宮城県白石市
計画の期間	平成24年度 (1年間)			

白石市都市計画図(抜粋)

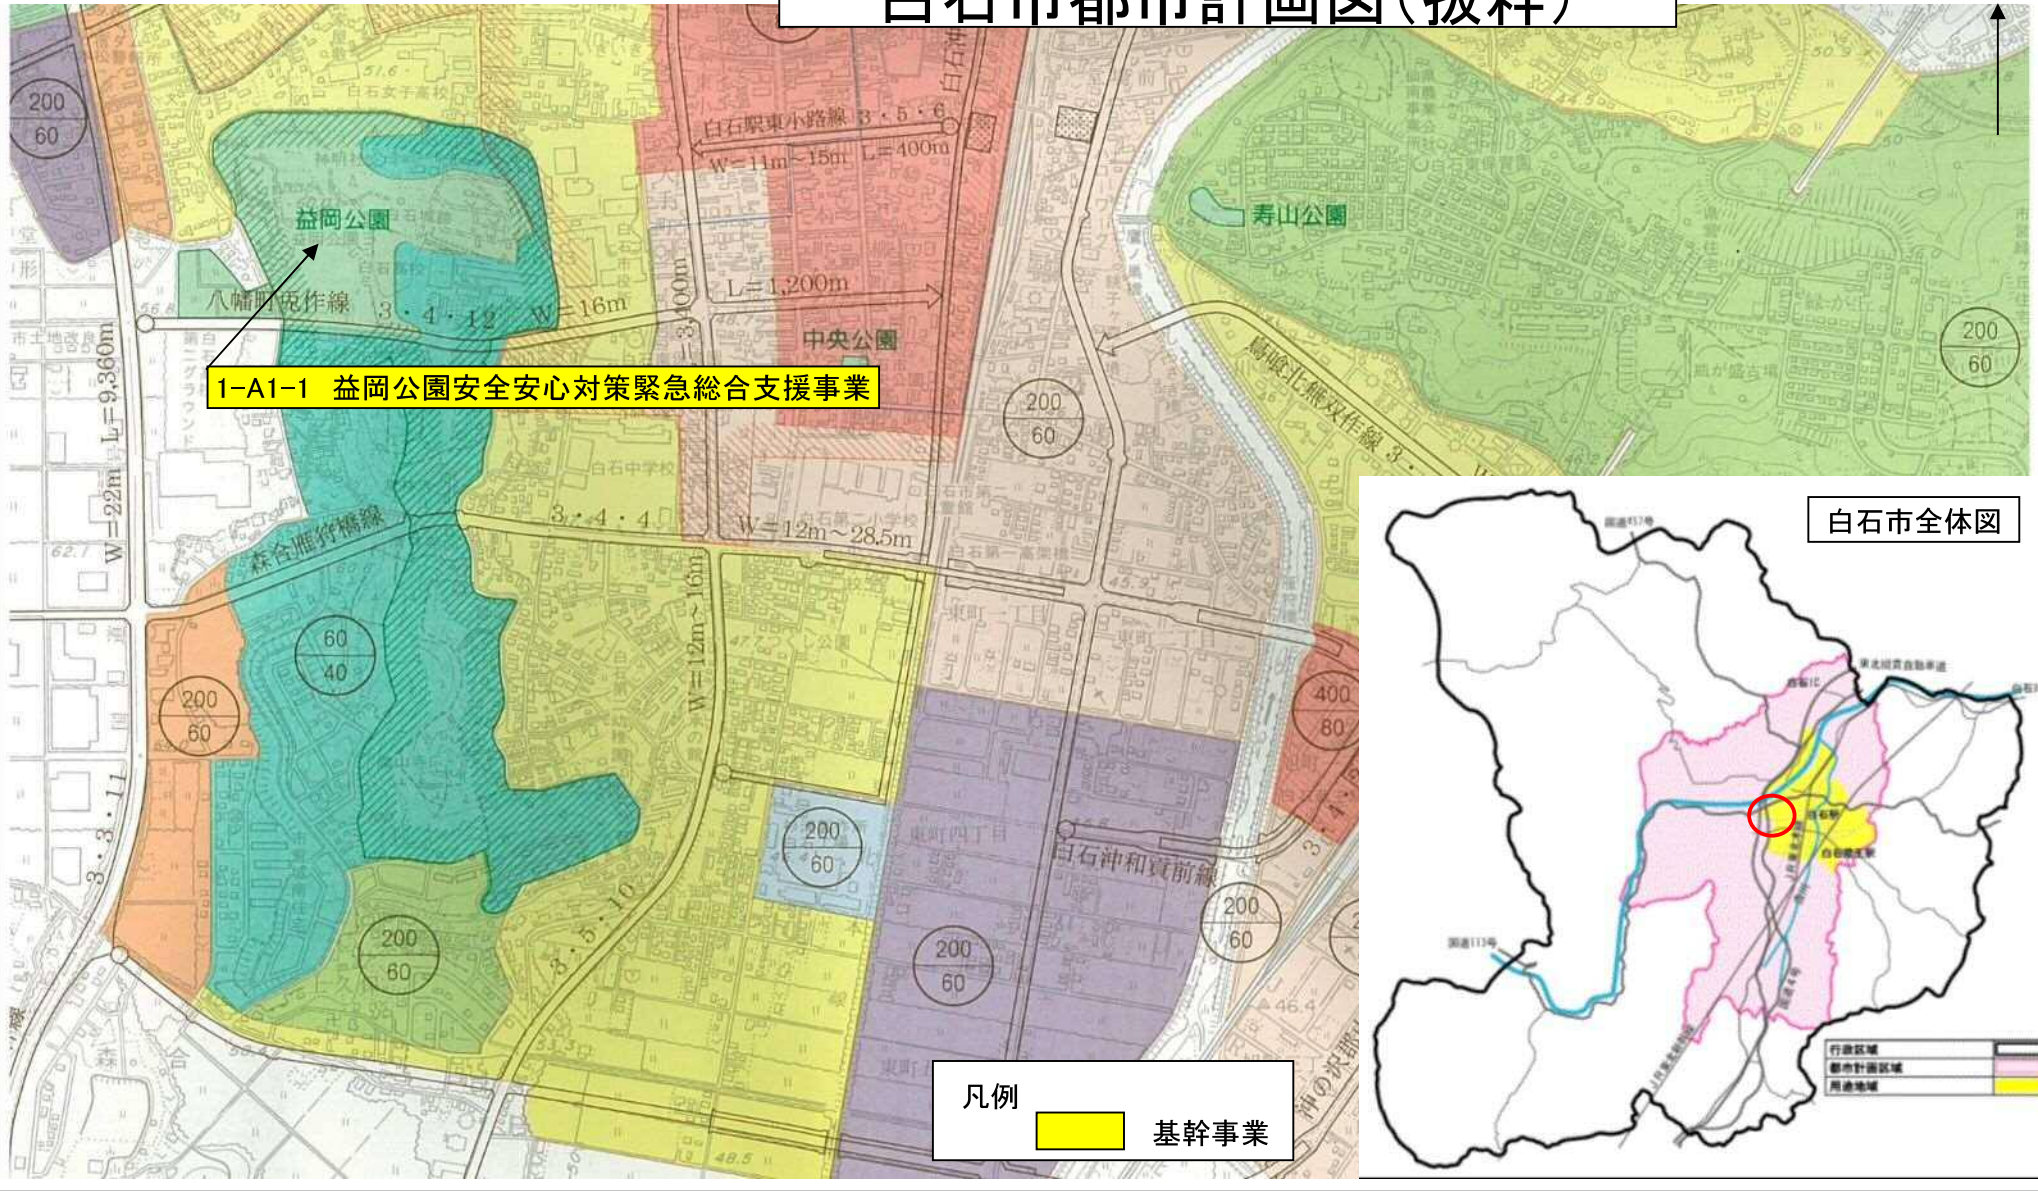

1-A1-1 益岡公園安全安心対策緊急総合支援事業

凡例
 基幹事業



白石市全体図
